

Calendarios de ejecución de programas y proyectos Septiembre 2020

DGA
ADUANAS



Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.

Alcance:

Plan de carrera es la reestructuración de la gestión de recursos humanos , el cual incluye en su 1era. fase diseño e implementación de modelo de competencias, manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos



Alineación Estratégica:

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

Responsable:

Yojani J. López J., Gerencia RRHH

Avance Total: 87%

Inicio:11/1/2018 **Fin:**21/04/2020

Presupuesto

RD\$1.5MM

Áreas Involucradas

Gerencia de RRHH
Gerencia de Desarrollo Institucional
Ministerio de Administración Publica (MAP)



Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.

Actividades	En-Mar 18	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19	En-Mar 20	Abr - Jun 20
Plan de Carrera	100%									
Diseño e implementación de modelo de competencias										
Manual de descripciones y perfiles de puestos	100%									
Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño	53%									
Actualización de políticas y Procedimientos de Recursos Humanos		100%								

Fase 1

- Finalización Manual de Descripciones de puestos.
- Valoración de puestos.
- Finalización Diseño e implementación de un sistema actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

Año 2019	Año 2020	Año 2021



Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Aduanas Móvil



Alcance:

Con la aplicación Aduanas Móvil los aforadores podrán introducir los cambios hallados durante la inspección física de las declaraciones en el momento en que ocurra el aforo, les permitirá visualizar los documentos adjuntos y tomar fotos de la carga inspeccionada de ser necesario.

Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

Responsable:

Luz Del Carmen, Sanchez, Tecnología

Avance Total: 66%

Inicio:21/12/2017 **Fin:**29/05/2020

Presupuesto

RD\$5.2MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología
Subdirección Operativa

Gerencia Desarrollo Institucional

Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Atención al Usuario



Alcance

1. Creación de herramienta tecnológica para la trazabilidad de las solicitudes de servicios
2. Remodelación lobby Sede Central
3. Creación de formularios para la solicitud de servicios

Alineación Estratégica:

OE.4 Asegurar la calidad de los servicios.

Responsable

Jeannette Del Risco

Avance:

Inicio:01/01/2018 **Fin:** 28/02/2020

Herramienta Tecnológica

100%

Remodelación Lobby

100%

Presupuesto

RD\$4MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología

Gerencia de Recursos Humanos

Consultoría Jurídica

Gerencia de Comunicaciones

Gerencia Administrativa

Gerencia Desarrollo Institucional



Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Atención al Usuario

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19	En-Mar 20
Herramienta Tecnológica	100%							
Remodelación Lobby	100%							

*La remodelación del lobby ha presentado retrasos en su entrega, por la situación del COVID-19



Proyectos Estratégicos

* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Exportador Autorizado



Alcance

Creación de mecanismos para otorgar los beneficios, contemplados en el Artículo 22 del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los Estados del Cariforum y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros” (EPA por sus siglas en inglés), bajo la categoría de **Exportador Autorizado** el exportador podrá bajo esta modalidad agilizar los trámites aduaneros y la disminución de sus costos, pues permite que una empresa dominicana califique como Exportador Autorizado a efectos de Origen, extendiendo una Declaración en Factura en lugar de emitir un Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, para sus exportaciones a países de la Comunidad Europea.

Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del Comercio Exterior

Responsable

Joaquín Lopez, Dpto. Norma de Origen

Avance Total:

Fase 1

Creación de la figura del exportador autorizado

Inicio:01/04/2018 **Fin:** 21/09/2018

100%

Presupuesto

RD\$0

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología

Consultoría Jurídica

Gerencia de Comunicaciones

Gerencia Desarrollo Institucional

Proyectos Estratégicos


* Avances al 30 de octubre 2020.

Proyecto Exportador Autorizado



* Avances al 30 de octubre 2020.

AVANCE POA 2020 SEPTIEMBRE

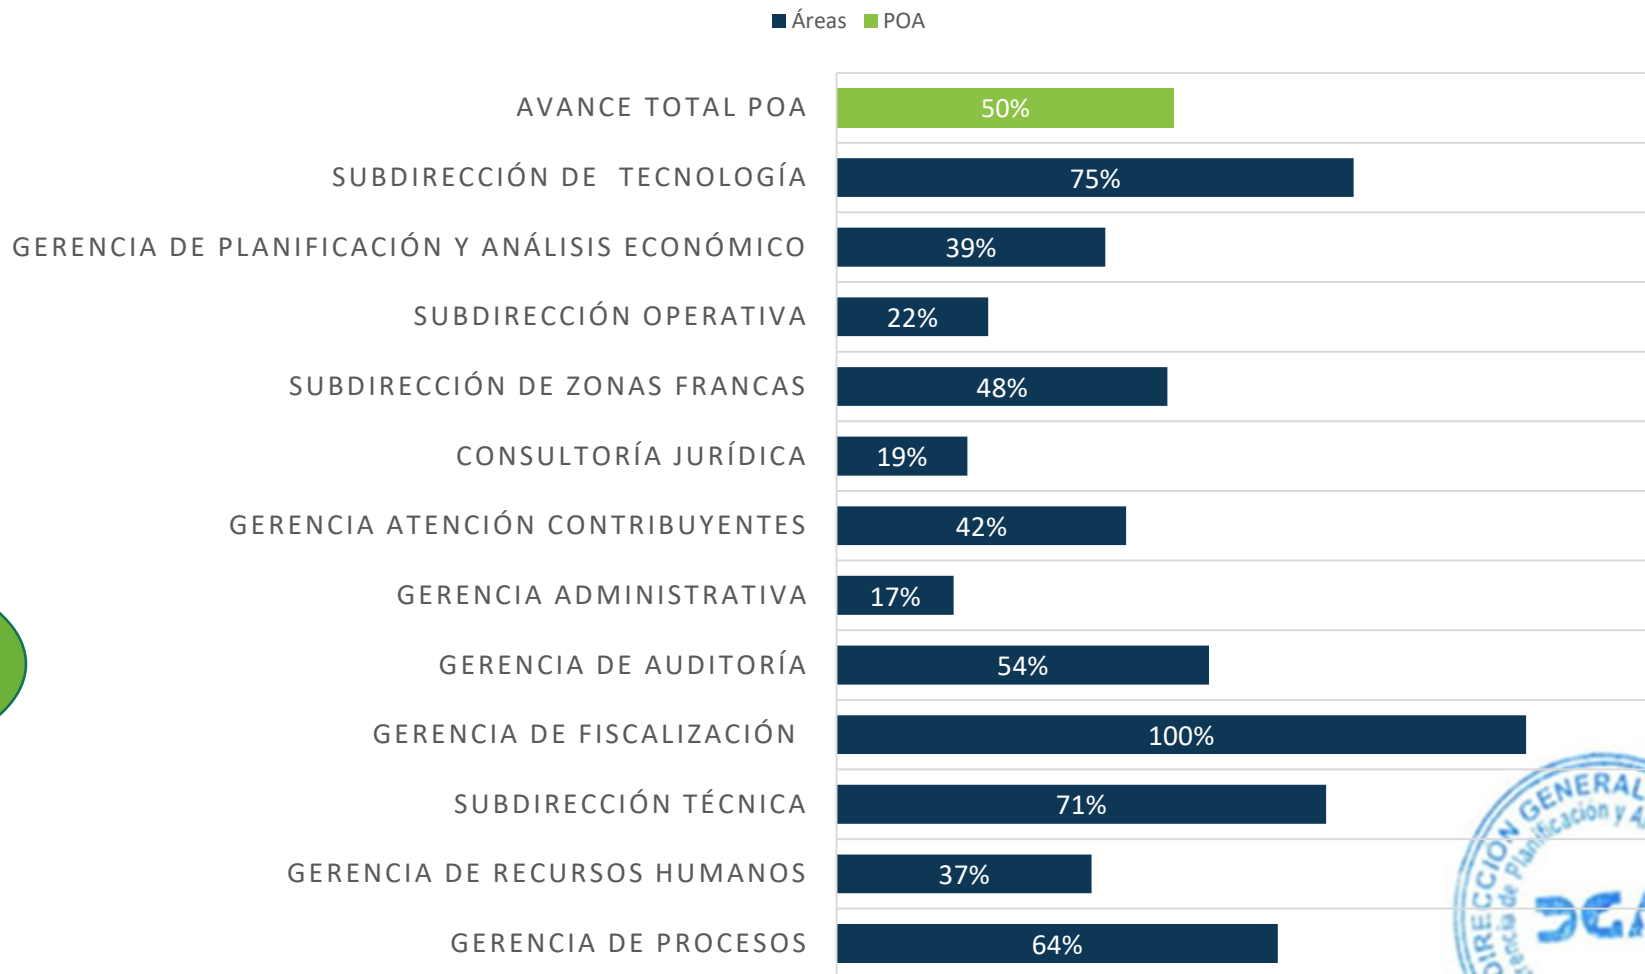

Promedio
General
50%

Nota: la ejecución del POA 2020 se ha visto afectada por la incidencia de la pandemia COVID-19



Solangie Carbonell
Gerente de Planificación y Análisis Económico
Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos
