



Calendarios de ejecución de programas y proyectos Noviembre 2019

DGA
ADUANAS



Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

SP

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.



Alcance:

Plan de carrera es la restructuración de la gestión de recursos humanos , el cual incluye en su 1era. fase diseño e implementación de modelo de competencias, manual de descripciones y perfiles de puestos, diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos

Alineación Estratégica:

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

Responsable:

Yojani J. López J., Gerencia RRHH

Avance Total: 54%

Inicio:11/1/2018

Fin:21/04/2020

Presupuesto

RD\$1.5MM

Áreas Involucradas

Gerencia de RRHH
Gerencia de Desarrollo Institucional
Ministerio de Administración Pública (MAP)



Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Plan de Carrera de RR. HH.

Actividades	En-Mar 18	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19	En-Mar 20	Abr - Jun 20
Plan de Carrera	54%									
Diseño e implementación de modelo de competencias										
Manual de descripciones y perfiles de puestos	72%									
Diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño	39%									
Actualización de políticas y Procedimientos de Recursos Humanos	33%									

Fase 1

Finalización Manual de Descripciones de puestos.

Valoración de puestos.

Finalización Diseño e implementación de un sistema actualización de políticas y procedimientos de Recursos Humanos.

Fase 2

Elaboración de programas de desarrollo.

Plan de carrera

Fase 3

Plan de sucesión

Año 2019	Año 2020	Año 2021



Solangie Carbonell
Gerencia de Planificación y Análisis Económico

Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Aduanas Móvil

Alcance:

Con la aplicación Aduanas Móvil los aforadores podrán introducir los cambios hallados durante la inspección física de las declaraciones en el momento en que ocurra el aforo, les permitirá visualizar los documentos adjuntos y tomar fotos de la carga inspeccionada de ser necesario.



Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del comercio exterior.

Responsable:

Luz Del Carmen, Sanchez, Tecnología

Avance Total: 55%

Inicio:21/12/2017 **Fin:**30/12/2019

Presupuesto

RD\$5.2MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología
Subdirección Operativa

Gerencia Desarrollo Institucional



Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

50

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Atención al Usuario



Alcance

1. Creación de herramienta tecnológica para la trazabilidad de las solicitudes de servicios
2. Remodelación lobby Sede Central
3. Creación de formularios para la solicitud de servicios

Alineación Estratégica:

OE.4 Asegurar la calidad de los servicios.

Responsable

Jeannette Del Risco

Avance:

Inicio: 01/01/2018 Fin: 30/12/2019

Herramienta Tecnológica	100%
Remodelación Lobby	50%
Creación de formularios para la solicitud de servicios	10%

Presupuesto

RD\$4MM

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología	Gerencia de Recursos Humanos	Consultoría Jurídica
Gerencia de Comunicaciones	Gerencia Administrativa	Gerencia Desarrollo Institucional



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Atención al Usuario

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 19	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
Herramienta Tecnológica	100%						
Remodelación Lobby	50%						
Creación de formularios para la solicitud de servicios				10%			



SC

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Exportador Autorizado

Alcance

Creación de mecanismos para otorgar los beneficios, contemplados en el Artículo 22 del Protocolo I del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre los Estados del Cariforum y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros" (EPA por sus siglas en inglés), bajo la categoría de **Exportador Autorizado** el exportador podrá bajo esta modalidad agilizar los trámites aduaneros y la disminución de sus costos, pues permite que una empresa dominicana califique como Exportador Autorizado a efectos de Origen, extendiendo una Declaración en Factura en lugar de emitir un Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1, para sus exportaciones a países de la Comunidad Europea.

Alineación Estratégica:

OE.1 Ser un ente facilitador del Comercio Exterior

Responsable

Joaquín Lopez, Dpto. Norma de Origen

Avance Total:

Fase 1

Creación de la figura del exportador autorizado

Inicio:01/04/2018 Fin: 21/09/2018

100%

Presupuesto

RD\$0

Áreas Involucradas

Gerencia de Tecnología

Consultoría Jurídica

Gerencia de Comunicaciones

Gerencia Desarrollo Institucional



Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

50

Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Proyecto Exportador Autorizado

Actividades	Abr - Jun 18	Jul - Sept 18	Oct - Dic 18	En-Mar 2019	Abr - Jun 19	Jul - Sept 19	Oct - Dic 19
Fase 1	100%						
Levantamiento de Información	100%						
Análisis de requerimiento	100%						
Elaboración Documento de requerimiento	100%						
Documentación		100%					
Resolución para el Exportador Autorizado		100%					
Formulario Exportador Autorizado		100%					
Proceso Figura Exportador Autorizado		100%					



Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Reformas y Transformación de la Aduana RD



Alcance

Dotar a la institución de una herramienta tecnológica moderna para cumplir con los siguientes objetivos:

- ✓ Reducción del tiempo de despacho, eficientizando la labor de aforo.
- ✓ Mayor control de la carga.
- ✓ Reducción del ilícito, por mayor capacidad de análisis.

Alineación Estratégica:

OE.2 Recaudar y gestionar de manera eficiente

OE.3 Fortalecer institucionalmente la Dirección General de Aduanas.

Responsable Jean Charles de Mondesert, Tecnologia



Proyectos Estratégicos

Avances de los proyectos al 30 de noviembre 2019.

Reformas y Transformación
de la Aduana RD

Presupuesto
A determinar



Áreas Involucradas

Sub-Dirección Tecnología

Sub-Dirección Técnica

Sub-Dirección Operativa

Gerencia Planificación Estratégica y Análisis Económico

Inteligencia Aduanera

Sub-Dirección De Zonas Francas

Gerencia de Comunicaciones

Proyectos solapan

Proyecto de mejora del proceso de declaración y aforo

Mejora de la Gestión de Riesgo

Calidad de la data

Mejora del proceso de exportación




Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

50


* Avances al 30 de noviembre 2019.

AVANCE POA 2019 NOVIEMBRE

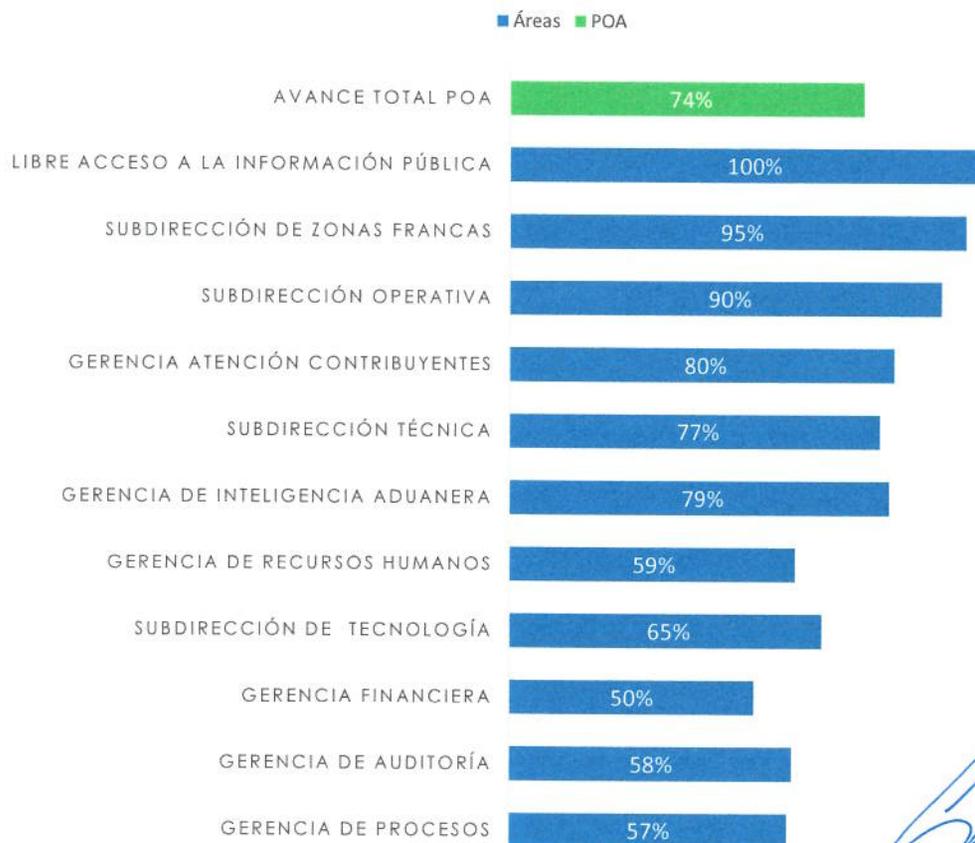

Promedio
General
74%




Solangie Carbonell
Gerente de Planificación y Análisis Económico
Gerencia de Planificación y Análisis Económico
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos
